

関係者 各位

田上区長 山岸 一郎


向原堰水路改修工事の支援体制について

県の「元気づくり支援金」事業として中野市を通じて申請していた標記水路の改修事業が採択され改修工事を実施することになりました。

工事概要は向原堰線の観音寺北72mをU字溝敷設する事業となります。

この事業は県の委託を受けた市が工事材料支給と重機借り上げを行い地元住民が協同で工事作業をすることが条件となっています。

よって今回の工事は受益する関係者でジョイントを組んで協力支援体制を作りたいと思いますのでご協力願います。

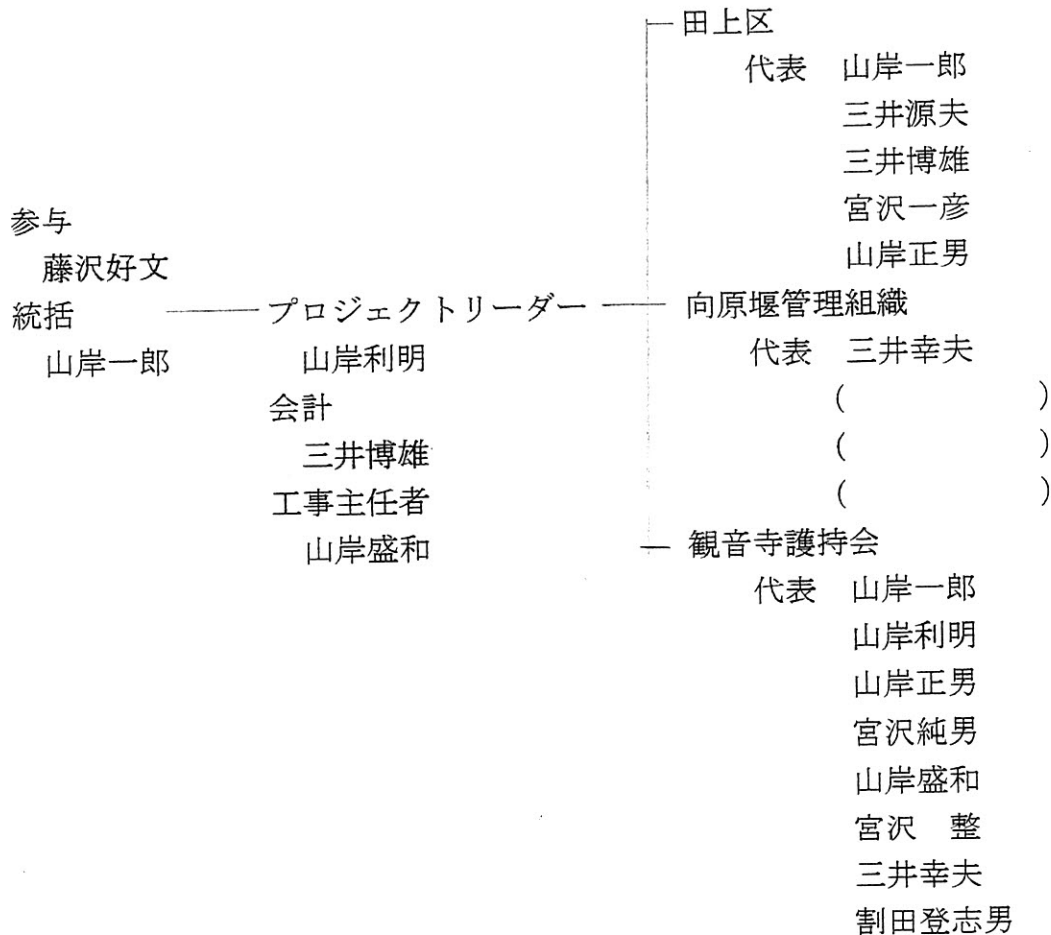

観音寺水路改修事業

○場 所 観音寺上入口

○改修長さ 72m

○人 数 10名

○予定日数 3日間

○改修日時

△機械

・バックホー	2台 × 3日
・シャベルローター	1台 × 3日
・ダンプ(2t)	1台 × 3日
・軽トラ	2台 (借りる)

△使用U字溝

長さ 600 外径 510 内径 290(内径高さ 400) 120本

△U字溝 フタ

長さ 600 幅400 厚み 60 (U字溝に掛かる場所は50) 119枚

グレーチング 長さ 600 幅400 厚み 50 1枚

△バラス使用量

10t車 3台分

△人数割り

・バックホー	2名
・アシスタント	2名
・トラック/軽トラ	3名
・ローダー	兼務
・U字溝スタッフ	<u>3名</u>
	10名

○集 合 AM 7:40 お寺前に集合

○持ち物 シャベル/草かき

作業手順

時間	8	9	10	11	12(昼)	1	2	3	4	5
チヨ-ハリ	2分									
U字溝移動	6分	バックホ-2台(初50ヶ分)								
		アシスタント2名 U字溝スタッフ3名								
バラス移動	3分	ダンプ/軽トラ		(ダンプは観音寺前)						
バックホ-①		1分	水路掘り	アシスタント1名ダンプに指示出す						
バラスを入れる			U字溝スタッフ3名 兼務							
バックホ-②		1分	U字溝を入れる							
U字溝手直し			U字溝スタッフ3名 兼務							
U字溝の周りに土を入れる			バックホ-②土を入れる		(バックホ-①スタッフが アシスタント1名		2tダンプに指示を出す			
2tダンプ		1分	水路掘りの土を入れる							
シャベルローダー			バラス積み込み		軽トラと兼務					
